

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段交通量 站工
程

理月

WORD TO PDF CONVERTER
[Http://www.word-to-pdf-converter.com](http://www.word-to-pdf-converter.com)
(2013.10.1-2013.10. 31)



北京 通工程咨 有限公司

大广高速（衡大段）交通量 站工程 地

目

1、 前言

2、 工程概况

3、 理 机

4、 工作情况

1、 基 制作工程

2、 理例会

3、 工地会

4、 存在

5、 承包商工作情况

1、 承包商人 状况

2、 交 站建 情况

3、 存在

6、 工程 更

7、 支付

8、 工程 度

WORD TO PDF CONVERTER
<http://www.word-to-pdf-converter.com>



TRIAL
VERSION

9、 其他

10、 附件

WORD TO PDF CONVERTER
[Http://www.word-to-pdf-converter.com](http://www.word-to-pdf-converter.com)



一、前言

大广高速公路河北省深州至大名（冀豫界）段，途经衡水市、邢台市和邯郸市，该路段是《国家高速公路网》中“5”大广至广州高速公路的重要组成部分，同时也是河北省高速公路网的“五纵、六横、七条”中的三纵，是河北省中部地区南北方向主要公路通道。

项目主管：大广高速公路衡大管理处

项目承包商：江安安防科技有限公司。

项目监理单位：北京一通工程咨询有限公司。

本报告2013年10月编制。

二、工程概况

本段高速公路交通量站点增工程。共在六处设置站点：第一起点至衡水互通段，桩号 K1544+684；第二青枢互通，桩号 K1640+900；第三威南互通，桩号 K1667+900；第四威南服务区，桩号 K1676+500；第五青枢互通，桩号 K1719+900；第六大名服务区，桩号 K1760+900。

三、组织机构


1、项目经理：北京一通工程咨询有限公司

2、人员配备：

总工程师 胡

测量工程师 彭大虎

3、项目办公室

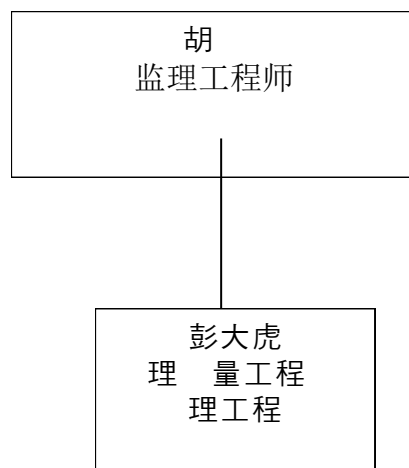

四、理 工作情况

- (1) 督促承包商安装交 站。
- (2) 督促承包商 交 站 精度。
- (3) 督促承包商做好完工 料工作。

五、承包商工作情况

1、 承包商人 状况

理部有 目 理 、 目 工高云雷和施工 伍10人。

2、工作完成情况

1、 本月 主要完成工作包括：

- a、完成了所有的交 站 安装（石黄互通 、青 互通 、威 收 站互通 、威 南服 区 、青 互通 、大名服 区 ）。
- b、完成了 敷 。
- c、完成了交 站 机 工作。
- d、完成了交 站系 工作。

2、完成施工 料 度情况：

- a、交 站 。
- b、交 站 安装工程 。

3、支付 度情况：

基 制作、 架 行了 量支付，支付金 553000元整，占合 同金 的38.2%。

3、存在：

部分文档未提交；

六、工程 更

本月承包商没有提出 更申 。

七、支付

基 制作、 架 行了 量支付， 支付金 553000元整， 占合同金 的38.2%。目前已 批， 正等待 目部 。

八、工程 度

附表：

九、其它

无

十、附件

《10月 工程 度表》

WORD TO PDF CONVERTER
[Http://www.word-to-pdf-converter.com](http://www.word-to-pdf-converter.com)



TRIAL
VERSION
