

河北省大广高速公路 衡大段筹建处文件

冀高衡大字〔2009〕190号

关于印发《大广高速公路深州至大名（冀豫界）段 “大干150天劳动竞赛”工程进度保障金管理实施细则》 修订稿的通知

处属各部门、总监办、各驻地办、各项目部：

现对《大广高速公路深州至大名（冀豫界）段“大干150天劳动竞赛”工程进度保障金管理实施细则》中的第四章（工程质量考核办法）、第五章（安全生产、文明施工考核办法）部分内容进行了修订，望处属各部门、总监办、各驻地办、各项目部针对重新修订部分内容认真阅读，并按照新修订细则中的规定认真

执行。

附件：大广高速公路深州至大名（冀豫界）段“大干 150 天
劳动竞赛”工程进度保障金管理实施细则（修订稿）

二〇〇九年六月十二日

（筹建处第 112 号施工管理通知）



主题词：工程 进度 管理 细则

抄报：高管局（集团）工程管理部

河北省大广高速公路衡大段筹建处综合办公室

2009 年 6 月 12 日

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段

“大干 150 天劳动竞赛”

工程进度保障金管理实施细则

（修订稿.试行）

第一章 总 则

第一条 为加强大广高速公路深州至大名（冀豫界）段（以下简称本项目）工程管理，更好地开展“质量年活动”以及“抓质量、促进度、保任务、迎国庆、大干 150 劳动竞赛活动”，确保本项目工程进度、质量、安全等建设管理目标的实现，依据本项目土建工程招标文件中关于工程进度保障金的规定，制定本细则。

第二条 根据土建工程施工招标文件 46.1 第（6）条规定，在承包人每期计量支付时暂扣应付金额的 3%作为工程进度保障金。

工程进度保障金的返还以考核工程进度、工程质量、安全生产和文明施工为依据，所占权值工程进度为 50%、工程质量为 35%、安全生产和文明施工为 15%。

第三条 本细则适用于本项目土建工程施工各标段承包人。

第四条 筹建处成立工程进度保障金考核领导小组，负责工程进度、工程质量、安全生产和文明施工三项管理目标考核工作。

组 长：廖济桢

副组长：禹书清、陈君朝、李建军

成 员：杜国庆、刘冀华、徐磊、尉红彬、翟忠伟、尹建国、

王 津、闫胜奇、郭振宇

工程进度保障金考核领导小组下设两个组，组织机构图如图 1 所示。

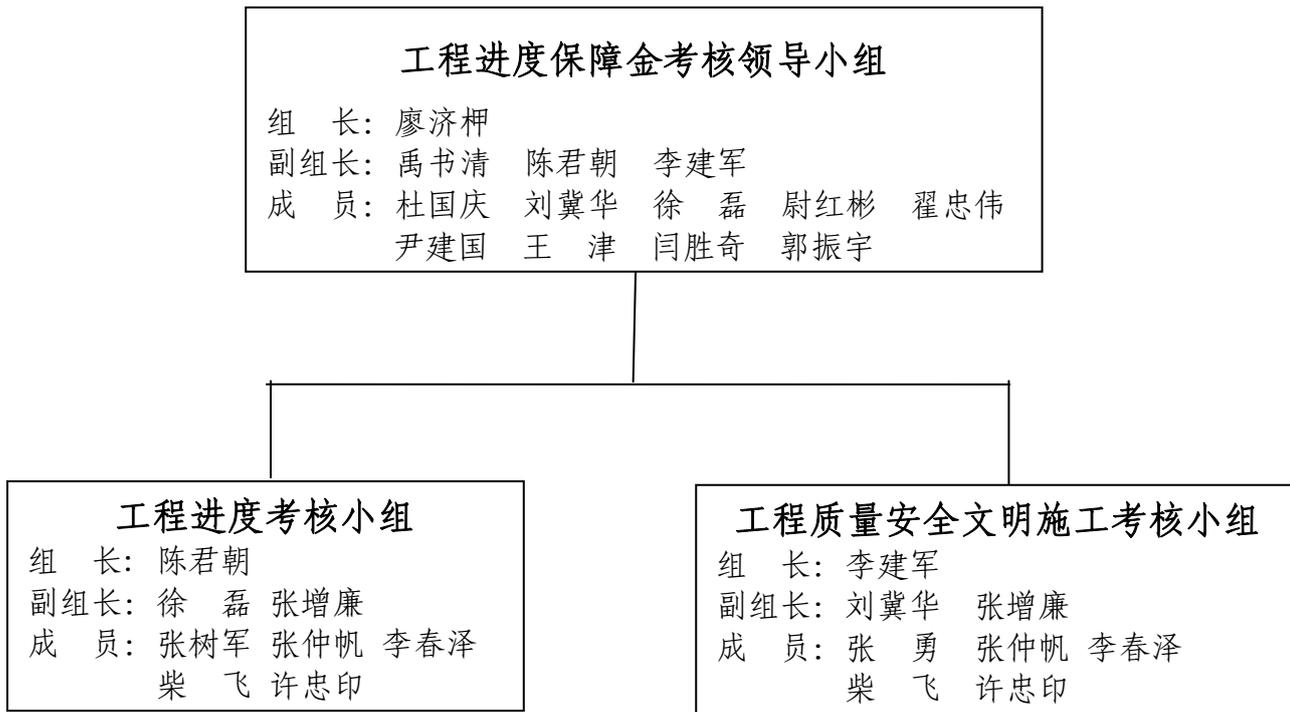


图 1 工程进度保障金考核领导小组组织机构图

第二章 工程进度保障金

第五条 工程进度保障金

针对“大干 150 天劳动竞赛”，2009 年 5 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日期间，工程进度保障金的基础金额计算：

改扩建段 LQ1 ~ LQ3 为 100 ~ 600 章清单合计（扣除专项暂定金）金额 40% 的 3%，计 808 万元；新建段 LQ4 ~ LQ27 为 100 ~ 400 章清单合计（扣除专项暂定金）金额 40% 的 3%，计 6490 万元；两项合计 7298 万元。

工程进度保障金按第二条规定的比例分配如下：工程进度部分 3649 万元，工程质量部分 2554 万元，安全生产和文明施工部分 1095 万元。

第三章 工程进度考核办法

第六条 工程进度考核

1、考核依据

进度考核以筹建处、总监办、驻地办、承包人和动态管理平台 5 方联合确认的进度计划为基础，对“大干 150 天劳动竞赛活动”制定的每

月工程进度目标进行考核。

2、考核形式

以月进度计划为考核目标，按月进行考核。根据动态管理平台每周网络计划报表数据，结合各单位人员、设备投入情况，对各标段实际完成情况进行统计考核。

3、工程进度保障金的返还

每月完成本月计划目标，返还该月的进度保障金；未完成本月计划目标的，当月进度保障金不予返还；

针对“大干 150 天”劳动竞赛，如在 9 月底全部完成“大干 150 天”劳动竞赛目标，则适当返还劳动竞赛阶段内未返还的进度保障金。

4、考核结果的公布

考核结果每月在动态管理平台上公布，作为返还工程进度保障金的依据。

5、考核罚则

对于在考核中虚报、作假，与实际现场施工进度不符的情况，一经查实，工程进度保障金一律不返还，并对有关责任单位和相关人员进行严肃处理。监理单位不认真审核，或串通施工单位虚报进度，查实后按每次 1 万元进行违约处理。

第四章 工程质量考核办法

第七条 工程质量考核

工程质量考核分为三部分：一是内业资料检查，二是外业施工现场检查，三是施工过程中日常巡回检查，所占权值分别为 15%、70%、15%。内业资料检查、外业施工现场检查、施工过程中日常巡回检查均按 100 分考核，最终得分按下面公式计算：

工程质量考核得分 = 内业资料检查 × 权值 + 外业施工现场检查得分 × 权值 + 施工过程中日常巡回检查得分 × 权值

1、内业资料检查

内业资料检查，参照质量年活动检查内容并结合质量保证资料内容，主要包括综合管理资料、质量管理资料、试验检测资料。

2、外业施工现场检查

外业施工现场检查主要包括结构工程、路基工程的施工工艺及外观质量检查，工程实体质量抽查，每个月检查项目、内容随工程进度情况适当调整。

3、施工过程中日常巡回检查

施工过程中日常巡回检查，采用加（减）分制，在 100 分基础上按照下表所列检查内容加（减）分。

施工过程中日常巡回检查

序号	项目	考核分值
1	省质监站或筹建处上级单位检查发现问题（书面）	减 30 分/次
2	筹建处通报（发现问题）	减 20 分/次
3	筹建处组织召开现场会（发现问题）	减 20 分/次
4	筹建处现场整改通知书（发现问题）	减 15 分/次
5	监理单位现场整改通知书（发现问题）	减 10 分/次
6	监理单位通报（表扬）	加 10 分/次
7	筹建处通报（表扬）	加 20 分/次
8	筹建处上级单位通报（表扬）	加 30 分/次
9	筹建处或上级单位组织召开现场会（先进、推介）	加 30 分/次

上级机关、筹建处或监理单位在施工过程中对施工现场进行检查，发现技术、工艺、材料、安全、环保、文明施工等方面存在问题，不符合相关要求的，均可发出书面的整改通知书、通知、通报，并作为扣分的依据。对于筹建处发出的整改通知书，如承包人及时整改、及时书面反馈并得到整改通知书签发人的认可，可不予扣分。对受到上级机关、筹建处或监理单位通报表彰的，按规定加分。

第八条 依据工程质量考核得分，按照下表进行返还。

工程质量考核等级划分表

等级	考核得分 (X)	返还当月工程进度保障金 (质量部分) 比例
1	$85 \leq X < 100$	100%
2	$70 \leq X < 85$	75%
3	$60 \leq X < 70$	50%
4	< 60	0

第九条 由于违反质量管理规定，造成重大质量事故的，只能评为 4 等。对考核中弄虚作假的，经查实后参照第六条第 5 款执行。

第十条 考核结果的公布

考核结束后工程质量考核结果将在大广高速公路衡大段动态管理平台上公布。

第十一条 工程质量考核每个月进行一次，并返还当月工程进度保障金 (质量部分)。具体考核时间另行通知。

第十二条 当月考核等级超过上月考核等级的，按照当月等级补发上月未返还的工程进度保障金 (质量部分)。

交工验收合同段工程质量评分值达到 98 分以上的，质量等级评为优良，将适当返还考核未返还的工程进度保障金 (质量部分)。

第五章 安全生产、文明施工考核办法

第十三条 安全生产、文明施工考核

安全生产、文明施工考核参照上级文件精神、《大广高速公路深州至大名 (冀豫界) 段安全生产管理办法》 (冀高衡大字 [2009] 69 号)、《大广高速公路深州至大名 (冀豫界) 段文明施工管理办法》 (冀高衡大字 [2009] 119 号) 等相关规范要求执行，内容包括内业资料检查、外业施工现场检查以及施工过程日常巡回检查，内业资料检查 15%、施工现场检查占 70% (权值)，施工过程日常巡回检查占 15% (权值)。内业资料检查、施工现场检查、施工过程日常巡回检查均按 100 分考核，最终得分按下面公式计算：

安全生产文明施工考核得分 = 内业资料检查得分 × 权值 + 施工现场检查得分 × 权值 + 施工过程日常巡回检查得分 × 权值

施工过程日常巡回检查按照第七条第三款规定执行。

第十四条 依据安全生产文明施工考核得分，按照下表进行返还。

安全生产文明施工考核等级划分表

等级	考核得分 (X)	返还当月工程进度保障金（安全部分）比例
1	$85 \leq X < 100$	100%
2	$70 \leq X < 85$	75%
3	$60 \leq X < 70$	50%
4	< 60	0

第十五条 由于违反安全管理规定，造成重大安全事故的，只能评为4等。对考核中弄虚作假的，经查实后参照第六条第5款执行。

第十六条 考核结果的公布

考核结束后安全生产文明施工检查考核结果将在大广高速公路衡大段动态管理平台上公布。

第十七条 安全生产文明施工检查考核每个月进行一次，并返还当月工程进度保障金（安全部分）。具体考核时间，另行通知。

第十八条 当月考核等级超过上月考核等级的，按照当月等级补发上月未返还的工程进度保障金（安全部分）。

工程交工时无重大安全事故发生的施工单位，将适当返还考核未返还的工程进度保障金（安全部分）。

第六章 附 则

第十九条 进度、质量、安全生产文明考核排名倒数前三名的施工单位，将召见其法人代表。

第二十条 本细则由河北省大广高速公路衡大段筹建处负责解释。

河北省大广高速公路衡大段“大干 150 天”劳动竞赛进度保障金分配详细表(进度)

单 位： 万 元

标段	承包单位	清单合 (100-600章)	专项暂 定金	扣除专项暂定 金清单合计	大干150天任 务量 40%、60%	工程进度 保障金 3%	进度所占比 例 50%	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
		A	B	C=A-B	$D=C*40\% (60\%)$	$E=D*3\%$	$F=E*50\%$	$G=(F/130)*10$	$H=(F/130)*30$	$I=(F/130)*30$	$K=(F/130)*30$	$L=(F/130)*30$
LQ1	中交第二公路工程局有限公司	23702	398	23304	9322	280	140	11	32	32	32	32
LQ2	邢台路桥建设总公司	27991	319	27672	11069	332	166	13	38	38	38	38
LQ3	衡水路桥工程有限公司	16640	348	16292	6517	196	98	8	23	23	23	23
LQ4	中交一公局第一工程有限公司	18384	415	17969	10781	324	162	12	37	37	37	37
LQ5	邢台路桥建设总公司	25380	526	24854	14912	448	224	17	52	52	52	52
LQ8	四川武通路桥工程局	22010	375	21635	12981	390	195	15	45	45	45	45
LQ9	中交一公局第六工程有限公司	18273	353	17920	10752	324	162	12	37	37	37	37
LQ10	中铁四局第一公路工程局有限公司	18608	419	18189	10913	328	164	13	38	38	38	38
LQ11	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	10249	362	9887	5932	178	89	7	21	21	21	21
LQ12	中交隧道工程局有限公司	10273	380	9893	5936	178	89	7	21	21	21	21
LQ13	西安萌兴高等级公路工程股份有限公司	19728	566	19162	11497	346	173	13	40	40	40	40
LQ14	中城建第二工程局有限公司	14398	299	14099	8459	254	127	-	32	32	31	31
LQ15	中铁十七局集团第三工程有限公司	16793	507	16286	9772	294	147	11	34	34	34	34
LQ16	中铁七局集团有限公司	12976	474	12502	7501	226	113	9	26	26	26	26
LQ17	中铁一局集团第二工程有限公司	15507	409	15098	9059	272	136	10	31	31	31	31
LQ18	中铁五局集团第一工程有限责任公司	15514	342	15172	9103	274	137	11	32	32	32	32
LQ19	中铁二十局集团第六工程有限公司	12851	390	12461	7477	224	112	9	26	26	26	26
LQ20	山东省公路建设(集团)有限公司	14659	392	14267	8560	258	129	10	30	30	30	30
LQ21	安徽开源路桥有限责任公司	9609	360	9249	5549	166	83	6	19	19	19	19
LQ22	中交集团公路一局桥隧工程有限公司	12234	350	11884	7130	214	107	8	25	25	25	25
LQ23	河北广通路桥工程有限公司	11831	284	11547	6928	208	104	-	26	26	26	26
LQ24	中铁二十二局集团第四工程有限公司	23929	409	23520	14112	424	212	16	49	49	49	49
LQ25	中铁十七局第三工程有限公司	22591	678	21913	13148	394	197	15	45	45	45	45
LQ26	中交二公局第六工程有限公司	21271	479	20792	12475	374	187	14	43	43	43	43
LQ27	邯郸市光太公路工程有限公司	22010	314	21696	13018	392	196	15	45	45	45	45
合计		437411	10148	427263	242903	7298	3649	263	847	847	846	846

河北省大广高速公路衡大段“大干150天”劳动竞赛进度保障金分配详细表(质量)

单 位： 万 元

标段	承包单位	清单合	专项暂	扣除专项暂	大干150天任	工程进度	质量所占比	5月	6月	7月	8月	9月
		(100-600章)	定金	金清单合计	务量 40%、60%	保障金 3%	例 35%					
		A	B	C=A-B	$D=C*40\% (60\%)$	$E=D*3\%$	$F=E*35\%$	$G=(F/130)*10$	$H=(F/130)*30$	$I=(F/130)*30$	$K=(F/130)*30$	$L=(F/130)*30$
LQ1	中交第二公路工程局有限公司	23702	398	23304	9322	280	98	6	23	23	23	23
LQ2	邢台路桥建设总公司	27991	319	27672	11069	332	116	8	27	27	27	27
LQ3	衡水路桥工程有限公司	16640	348	16292	6517	196	69	5	16	16	16	16
LQ4	中交一公局第一工程有限公司	18384	415	17969	10781	324	113	9	26	26	26	26
LQ5	邢台路桥建设总公司	25380	526	24854	14912	448	157	13	36	36	36	36
LQ8	四川武通路桥工程局	22010	375	21635	12981	390	137	9	32	32	32	32
LQ9	中交一公局第六工程有限公司	18273	353	17920	10752	324	113	9	26	26	26	26
LQ10	中铁四局第一公路工程局有限公司	18608	419	18189	10913	328	115	7	27	27	27	27
LQ11	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	10249	362	9887	5932	178	62	6	14	14	14	14
LQ12	中交隧道工程局有限公司	10273	380	9893	5936	178	62	6	14	14	14	14
LQ13	西安萌兴高等级公路工程股份有限公司	19728	566	19162	11497	346	121	9	28	28	28	28
LQ14	中城建第二工程局有限公司	14398	299	14099	8459	254	89	-	23	22	22	22
LQ15	中铁十七局集团第三工程有限公司	16793	507	16286	9772	294	103	7	24	24	24	24
LQ16	中铁七局集团有限公司	12976	474	12502	7501	226	79	7	18	18	18	18
LQ17	中铁一局集团第二工程有限公司	15507	409	15098	9059	272	95	7	22	22	22	22
LQ18	中铁五局集团第一工程有限责任公司	15514	342	15172	9103	274	96	8	22	22	22	22
LQ19	中铁二十局集团第六工程有限公司	12851	390	12461	7477	224	78	6	18	18	18	18
LQ20	山东省公路建设(集团)有限公司	14659	392	14267	8560	258	90	6	21	21	21	21
LQ21	安徽开源路桥有限责任公司	9609	360	9249	5549	166	58	6	13	13	13	13
LQ22	中交集团公路一局桥隧工程有限公司	12234	350	11884	7130	214	75	7	17	17	17	17
LQ23	河北广通路桥工程有限公司	11831	284	11547	6928	208	73	-	19	18	18	18
LQ24	中铁二十二局集团第四工程有限公司	23929	409	23520	14112	424	149	13	34	34	34	34
LQ25	中铁十七局第三工程有限公司	22591	678	21913	13148	394	138	10	32	32	32	32
LQ26	中交二公局第六工程有限公司	21271	479	20792	12475	374	131	11	30	30	30	30
LQ27	邯郸市光太公路工程有限公司	22010	314	21696	13018	392	137	13	31	31	31	31
合计		437411	10148	427263	242903	7298	2554	188	593	591	591	591

河北省大广高速公路衡大段“大干150天”劳动竞赛进度保障金分配详细表(安全)

单 位： 万 元

标段	承包单位	清单合 (100-600章)	专项暂 定金	扣除专项暂定 金清单合计	大干150天任 务量 40%、60%	工程进度 保障金 3%	安全所占比 例 15%	5月	6月	7月	8月	9月
		A	B	C=A-B	D=C*40%(60%)	E=D*3%	F=E*15%	G=(F/130) *10	H=(F/130) *30	I=(F/130) *30	K=(F/130) *30	L=(F/130) *30
LQ1	中交第二公路工程局有限公司	23702	398	23304	9322	280	42	2	10	10	10	10
LQ2	邢台路桥建设总公司	27991	319	27672	11069	332	50	2	12	12	12	12
LQ3	衡水路桥工程有限公司	16640	348	16292	6517	196	29	1	7	7	7	7
LQ4	中交一公局第一工程有限公司	18384	415	17969	10781	324	49	5	11	11	11	11
LQ5	邢台路桥建设总公司	25380	526	24854	14912	448	67	7	15	15	15	15
LQ8	四川武通路桥工程局	22010	375	21635	12981	390	58	6	13	13	13	13
LQ9	中交一公局第六工程有限公司	18273	353	17920	10752	324	49	5	11	11	11	11
LQ10	中铁四局第一公路工程有限公司	18608	419	18189	10913	328	49	5	11	11	11	11
LQ11	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	10249	362	9887	5932	178	27	3	6	6	6	6
LQ12	中交隧道工程局有限公司	10273	380	9893	5936	178	27	3	6	6	6	6
LQ13	西安萌兴高等级公路工程股份有限公司	19728	566	19162	11497	346	52	4	12	12	12	12
LQ14	中城建第二工程局有限公司	14398	299	14099	8459	254	38	-	10	10	9	9
LQ15	中铁十七局集团第三工程有限公司	16793	507	16286	9772	294	44	4	10	10	10	10
LQ16	中铁七局集团有限公司	12976	474	12502	7501	226	34	2	8	8	8	8
LQ17	中铁一局集团第二工程有限公司	15507	409	15098	9059	272	41	5	9	9	9	9
LQ18	中铁五局集团第一工程有限责任公司	15514	342	15172	9103	274	41	5	9	9	9	9
LQ19	中铁二十局集团第六工程有限公司	12851	390	12461	7477	224	34	2	8	8	8	8
LQ20	山东省公路建设(集团)有限公司	14659	392	14267	8560	258	39	3	9	9	9	9
LQ21	安徽开源路桥有限责任公司	9609	360	9249	5549	166	25	1	6	6	6	6
LQ22	中交集团公路一局桥隧工程有限公司	12234	350	11884	7130	214	32	4	7	7	7	7
LQ23	河北广通路桥工程有限公司	11831	284	11547	6928	208	31	-	7	8	8	8
LQ24	中铁二十二局集团第四工程有限公司	23929	409	23520	14112	424	63	3	15	15	15	15
LQ25	中铁十七局第三工程有限公司	22591	678	21913	13148	394	59	3	14	14	14	14
LQ26	中交二公局第六工程有限公司	21271	479	20792	12475	374	56	4	13	13	13	13
LQ27	邯郸市光太公路工程有限公司	22010	314	21696	13018	392	59	3	14	14	14	14
合计		437411	10148	427263	242903	7298	1095	82	253	254	253	253

